Bulletin Bruit France
1ER TRIMESTRE 2026

Secteur basse vallée : Saint-Julien-Montdenis, Villargondran et Saint-Martin-la-Porte

TUNNEL EURALPIN LYON TURIN

SYNTHESE

Depuis janvier 2022, TELT et les Groupements enregistrent en continu le bruit généré par le chantier CO8 à l'aide de capteurs installés chez des riverains et analysent les données. Depuis juillet 2024, de nouveaux capteurs viennent compléter ce réseau de mesures, en lien avec les chantiers sur les différentes plateformes du CO11.

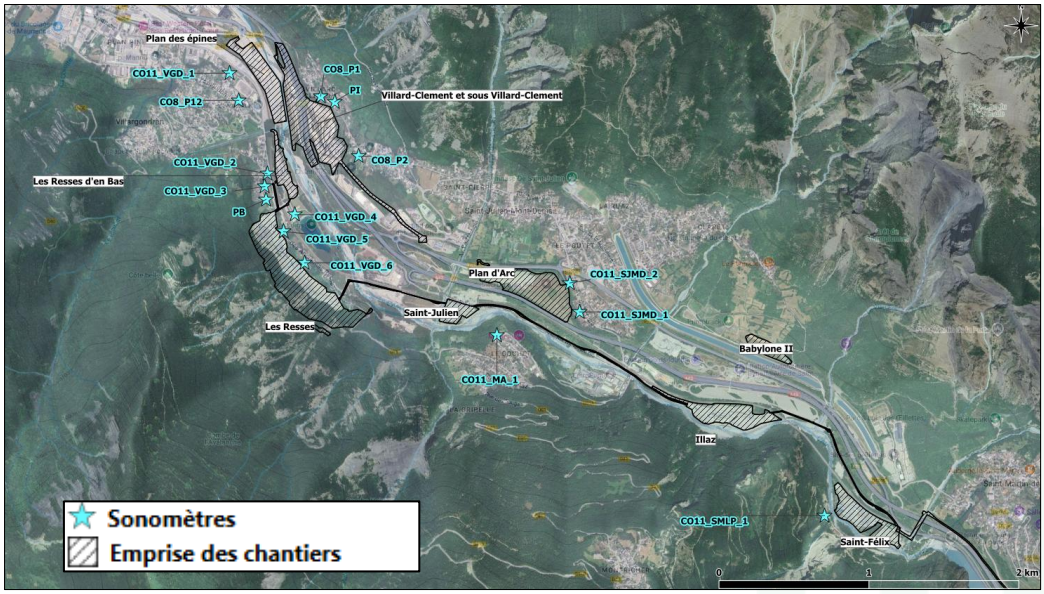

Fonds cartographiques : Fond Google Satellite et Google Terrain Hybrid

Les données acoustiques recueillies par les dispositifs de surveillance corrélées avec les signalements conduisent à évaluer des situations sonores **satisfaisantes ou acceptables** autour des différentes plateformes de la basse vallée.

AMBIANCE SONORE	PERIODE DIURNE	PERIODE NOCTURNE
CO11_VGD_1, CO11_VGD_2, CO11_VGD_3, CO11_VGD_4, CO11_SMLP_1, CO11_SJMD_1, CO11_SJMD_2, CO11_MA_1	satisfaisante – gênante – insatisfaisante	pas d'activité nocturne
PB, PI, CO8_P1, CO8_P12	satisfaisante – gênante – insatisfaisante	satisfaisante – gênante – insatisfaisante
CO11_VGD_5, CO11_VGD_6	satisfaisante – acceptable – gênante – insatisfaisante	pas d'activité nocturne
CO8_P1	satisfaisante – gênante – insatisfaisante	satisfaisante – acceptable – gênante – insatisfaisante

1 **Signalement lié à l'acoustique sur ce secteur.**

Autres ressources

Lexique de définitions et légendes

TELT Lyon Turin – Pour les riverains

PLUS DANS LE DETAIL...

Les tableaux récapitulatifs ci-après présentent les dépassements, en lien ou non avec le chantier, des seuils sonores imposés aux chantiers en périodes diurnes et nocturnes, pour l'ensemble des mesures autour du CO11 et du CO8. Les dépassements non liés au chantier sont généralement corrélés à la météo, au bruit de l'Arc, à des activités de voisinage et aux bruits de la nature.

Période diurne (07h00-22h00)

	Janvier		Février		Mars		1er Trimestre 2026
point	Nombre de jours avec dépassements liés au chantier	Nombre de jours avec dépassements non liés au chantier	Nombre de jours avec dépassements liés au chantier	Nombre de jours avec dépassements non liés au chantier	Nombre de jours avec dépassements liés au chantier	Nombre de jours avec dépassements non liés au chantier	% de jours sans dépassement lié au chantier
CO11_VGD_1	0	0	0	0	0	0	100%
CO11_VGD_2	0	0	0	0	0	0	100%
CO11_VGD_3	0	0	0	0	0	0	100%
CO11_VGD_4	0	0	0	0	0	0	100%
CO11_VGD_5	3	0	3	1	2	0	91%
CO11_VGD_6	0	0	4	1	0	0	96%
CO11_SMLP_1	0	0	0	2	0	2	100%
CO11_SJMD_1	0	0	0	0	0	0	100%
CO11_SJMD_2	0	0	0	0	0	0	100%
CO11_MA_1	0	0	0	0	0	0	100%
PB	0	0	0	2	0	0	100%
PI	0	1	0	0	0	0	100%
CO8_P1	0	0	0	1	0	2	100%
CO8_P2	0	0	0	0	0	0	100%
CO8_P12	0	0	0	0	0	0	100%

Période Nocturne (22h00-07h00)

	Janvier		Février		Mars		1er Trimestre 2026
point	Nombre de nuits avec dépassements liés au chantier	Nombre de nuits avec dépassements non liés au chantier	Nombre de nuits avec dépassements liés au chantier	Nombre de nuits avec dépassements non liés au chantier	Nombre de nuits avec dépassements liés au chantier	Nombre de nuits avec dépassements non liés au chantier	% de nuits sans dépassement lié au chantier
CO11_VGD_1	NC	0	NC	1	NC	1	100%
CO11_VGD_2	NC	0	NC	2	NC	0	100%
CO11_VGD_3	NC	0	NC	3	NC	0	100%
CO11_VGD_4	NC	0	NC	0	NC	0	100%
CO11_VGD_5	NC	0	NC	0	NC	0	100%
CO11_VGD_6	NC	0	NC	0	NC	0	100%
CO11_SMLP_1	NC	30	NC	28	NC	30	100%
CO11_SJMD_1	NC	0	NC	0	NC	0	100%
CO11_SJMD_2	NC	5	NC	8	NC	Plusieurs	100%
CO11_MA_1	NC	0	NC	2	NC	0	100%
PB	0	3	0	8	0	2	100%
PI	0	1	0	1	0	0	100%
CO8_P1	0	0	0	3	0	0	100%
CO8_P2	1	0	0	2	0	0	99%
CO8_P12	0	0	0	1	0	0	100%

NC = non concerné (pas d'activité nocturne), X = pas de mesure (défaut d'alimentation).

Nota : Le point CO11_SMLP_1 est influencé par diverses sources sonores notamment l'Arc dont le débit varie conduisant à des dépassements récurrents. Le seuil à respecter va être redéfini pour ce point (niveau de bruit résiduel sous-évalué).

FOCUS SUR LES DEPASSEMENTS SONORES

12 dépassements en lien avec le chantier ont été mesurés en période diurne et tous concernent le site des Resses.
1 dépassement nocturne attribué aux activités de la plateforme Villard-Clément a également été enregistré.

Date (ou nombre)	Point de mesure	Période	Évaluation du dépassement	Origine du bruit identifiée sur le chantier	Actions correctives
1 nuit en janvier	CO08_P2	Nocturne	Moyen	Cumul de forts vents et activité de bétonnage récurrente toute la nuit	Situation ponctuelle, pas d'action corrective
2 jours en janvier	CO11_VGD_5	Diurne	Faible	Travaux de terrassement pour l'installation d'une clôture	Situation ponctuelle, pas d'action corrective
1 jour en janvier			Fort		
2 jours en février			Faible	Travaux de terrassement pour l'installation du portail d'entrée en plus des activités identiques à chaque jour.	
1 jour en février			Fort	Travaux de terrassement pour l'installation du portail d'entrée.	
4 jours en février	CO11_VGD_6	Diurne	Faible	Travaux identiques à chaque jour.	Des protections acoustiques (murs ou merlons) vont être mis en place. Les études sont en cours.
2 jours en mars	CO11_VGD_5	Diurne	Faible	Travaux d'entretien des bâtiments du chantier.	Situation ponctuelle, pas d'action corrective

FOCUS SUR LES SIGNALEMENTS DES RIVERAINS

Au cours de ce 1er trimestre, 1 signalement de riverains a été répertorié qui a été attribué au site des Resses, il n'a pas été corrélé à un dépassement du seuil sonore autorisé.

Date	Période	Nature de la nuisance sonore	Localisation de la gêne	Origine du bruit identifiée sur le chantier	Actions correctives
19/02/26	Nocturne	Un groupe électrogène est resté allumé la nuit pour alimenter un éclairage qui n'a pas été éteint.	Les Resses	Groupe éléctrogène	Rappel des consignes aux conducteurs d'engins.

TELT reste attentif aux besoins des riverains pour réduire les nuisances sonores que le chantier peut occasionner.

Un numéro unique est à votre disposition pour signaler d'éventuelles nuisances : 04 85 98 98 98
