
Bulletin Eau France
2EME TRIMESTRE 2026

Surveillance des milieux aquatiques – SYNTHESE

TUNNEL EURALPIN LYON TURIN

EAUX SUPERFICIELLES
QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE


8 Points de mesure en amont et en aval des chantiers
Suivis **hebdomadaires** et **mensuels**
32 paramètres physico-chimiques suivis

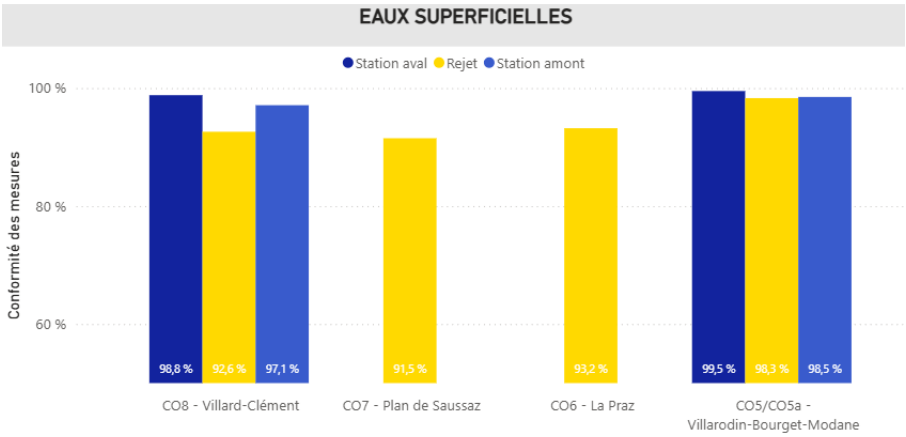

Pour CO67, les prélèvements dans l'Arc sont suspendus pour des raisons de sécurité (accès à l'Arc), d'où l'absence de résultats pour ces chantiers.


EAUX SOUTERRAINES
QUALITE & RESSOURCES

33 Piézomètres
130 sources suivies
21 paramètres mesurés

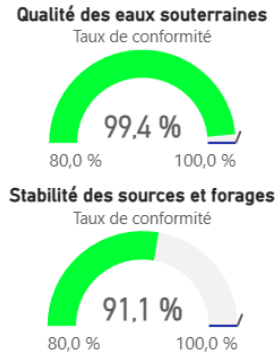

EAUX DE CHANTIER
CONSOMMATIONS & REJETS

3 types de consommations suivies rigoureusement : eau potable, eau de nappe et eau réutilisée

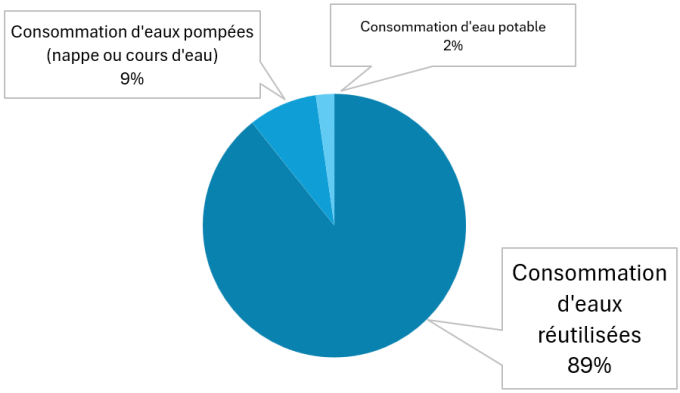

Répartition des eaux consommées au 2ème trimestre 2026

CONCLUSION

- ✓ **Absence d'impact** des rejets d'eau des différents chantiers dans l'Arc.
- ✓ **Absence d'incidence** sur la qualité des eaux souterraines
- ✓ **Impact faible sur les ressources en eaux souterraines ce trimestre**
  - **Absence de nouvelles variations particulière au cours du trimestre**
  - Dans la continuité des observations des trimestres précédents : **des variations particulières sont toujours notées sur 6 sources et 3 forages**
  - **3 sources** et **1 forage** sont sous surveillance particulière avec **une évolution non liée aux travaux de TELT**
  - **Aucune observation particulière n'est relevée pour les 121 autres sources et 12 autres forages suivis**
- ✓ **89% des consommations sont de l'eau réutilisée.**
- ✓ Le débit total d'eaux d'exhaure après traitement rejetées dans l'Arc représente **au plus 1,07%** du débit moyen de l'Arc.

TELT | Direction des affaires générales chargée du développement durable, de l'environnement et de la sécurité au travail
Web: telt.eu Mail: info@telt-sas.com
